


(2) 道路・公園整備状況に関する報告

1. 信太5号線及び公園の整備スケジュール

		R3年度						R4年度									
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
信太5号線	道路整備工事	← 伐採・掘削						→ 道路整備工事									
	地下埋設物等工事							← 水道			→ ガス・電気						
	交通規制	← 片側交互通行						← 作業時間通行止			← 終日通行止め			← 片側交互通行			
公園整備	公園整備工事							← 伐採・造成			→ 施設整備工事 (R5年度:引続き整備)						
	建築新築工事 (活動拠点施設)							← 建築工事									

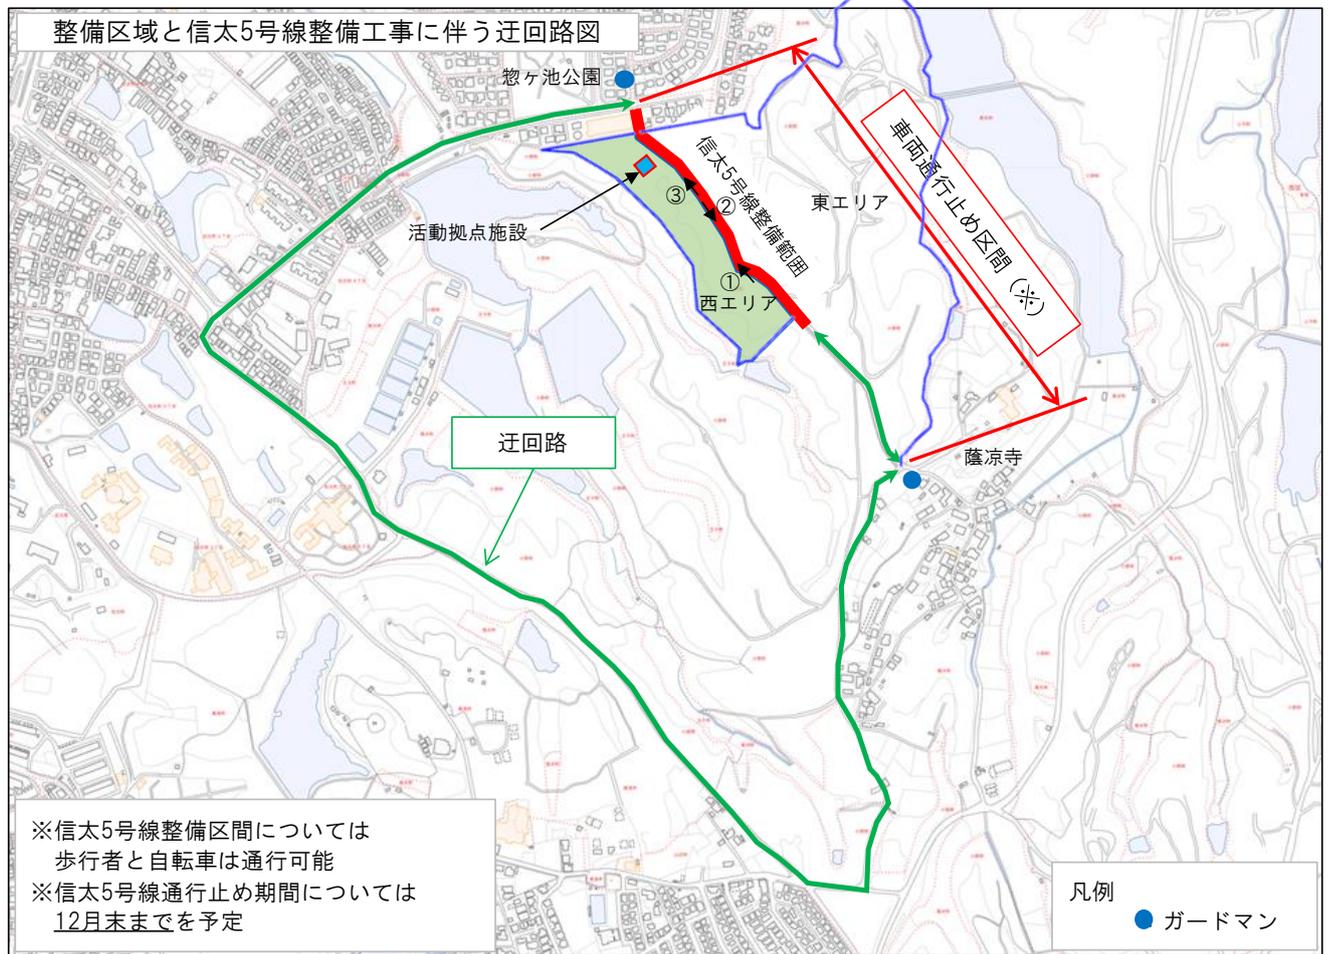

※10/27撮影

2. 公園整備

1) 整備状況

① 駐車場予定地付近




② 活動拠点施設予定地付近



③ 主園路予定地



[西エリア計画平面図]

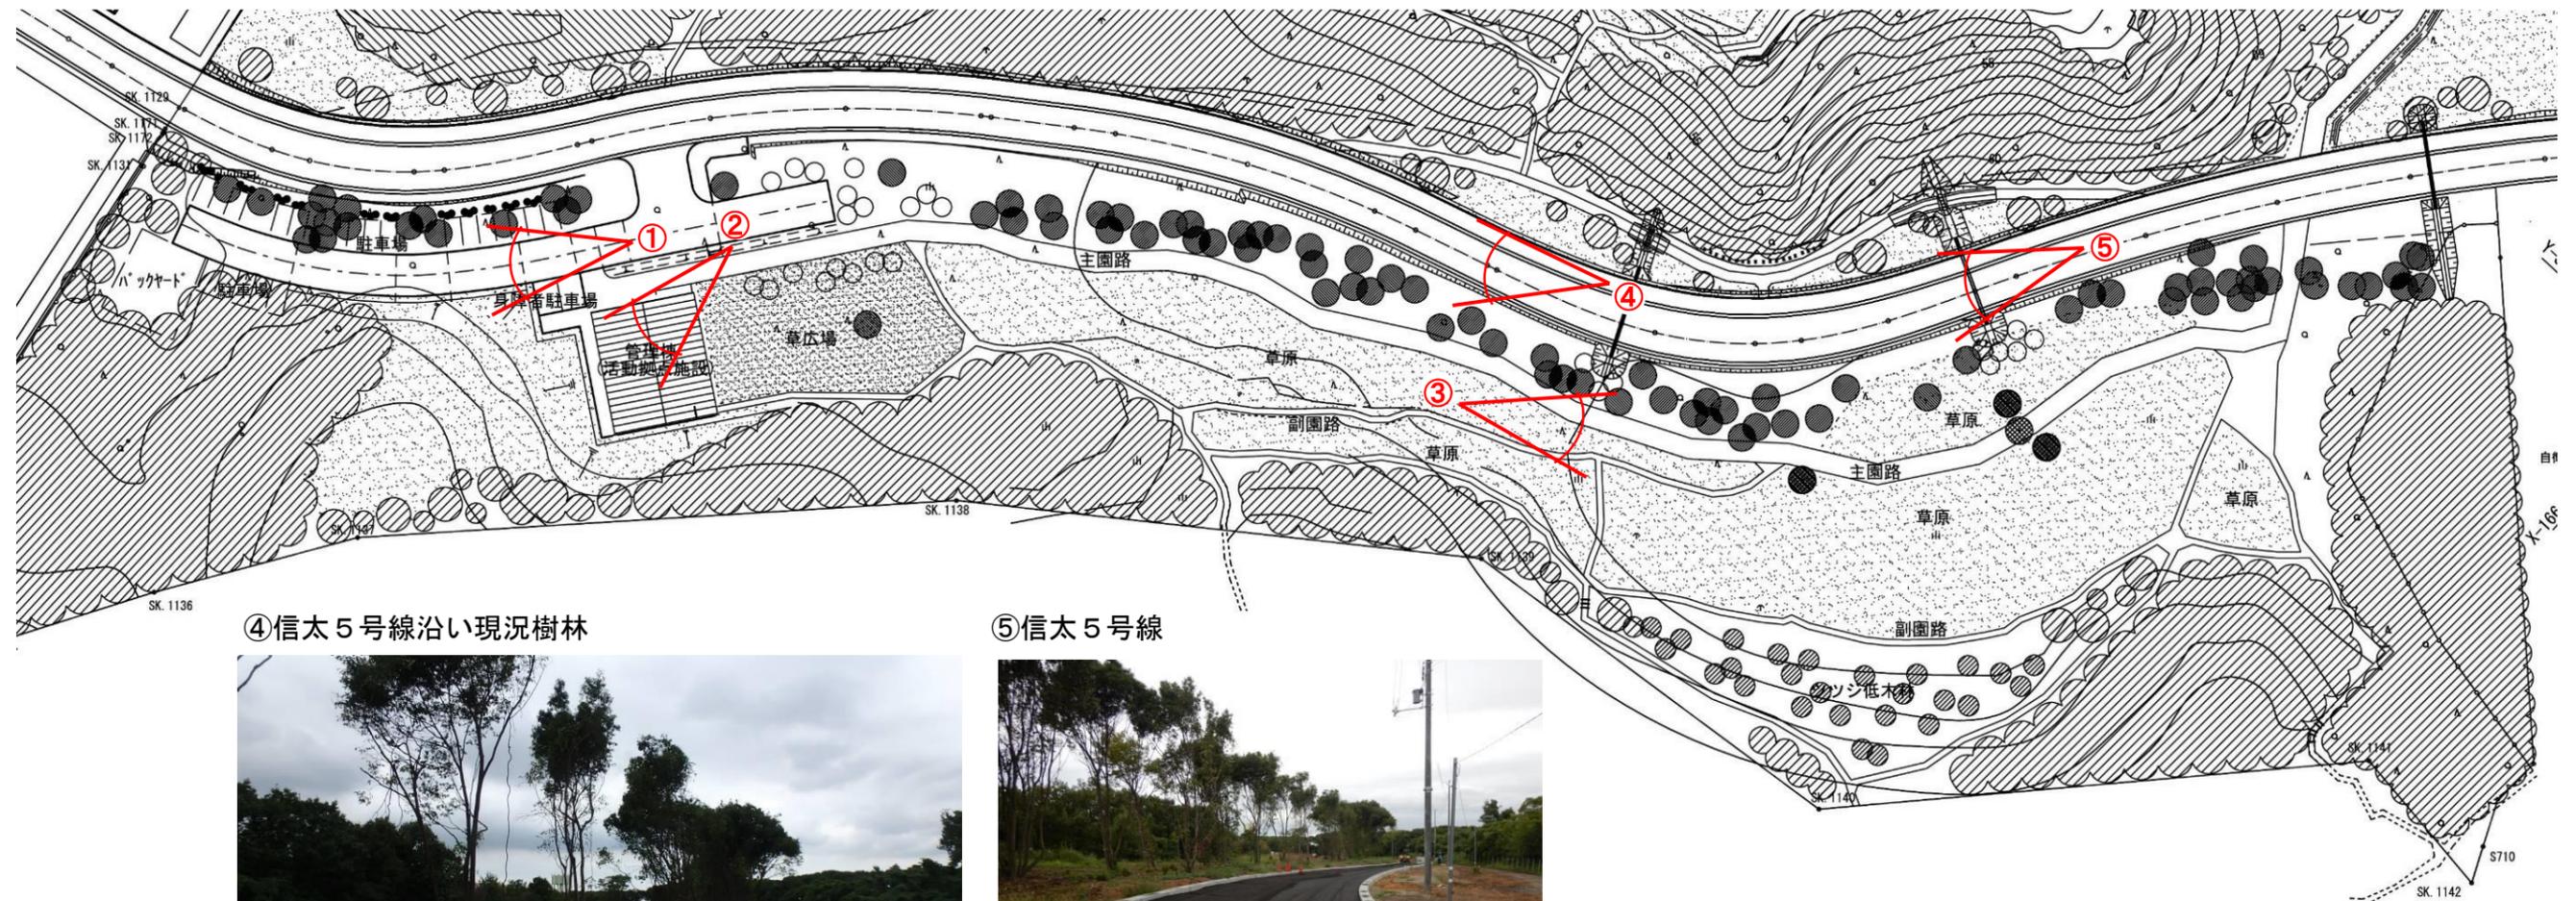

④ 信太5号線沿い現況樹林




⑤ 信太5号線



2) 活動拠点施設北側造成法面

[位置図]

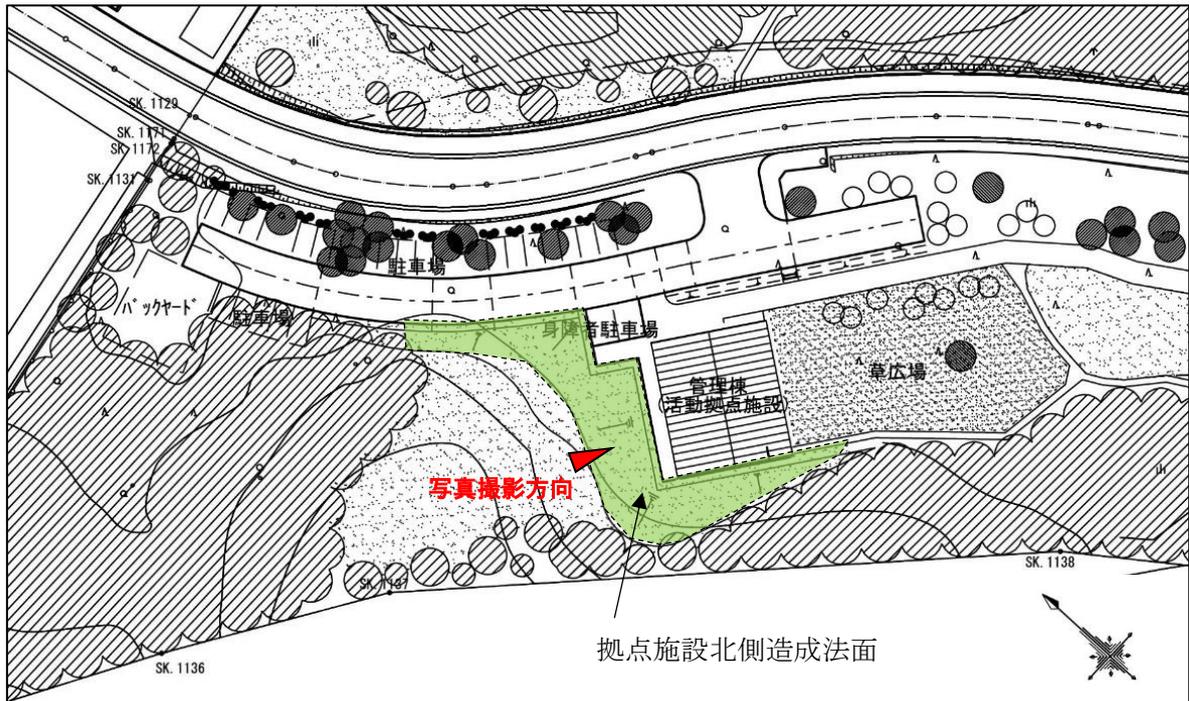

(現状)

- ・右写真の上が活動拠点施設建設予定地。
- ・造成盛土法面の表面に、雨水の影響でエロージョン（表面の浸食）が生じはじめている。

(対応案)

- ・当面は状況観察とし、浸食が進むようであれば浸食防止のために環境に影響の少ないノシバの張芝等を検討する。



3. 活動拠点施設整備

○外壁の仕上色

- ・周辺景観に馴染むことを配慮し、落ち着いた雰囲気となるよう濃い色合いとする。
- ・サイディング：
ケイミュー株式会社
（セフィロウッド 16mm、
MW ブリュレブラック）



(メーカーカタログより)

4. 活動拠点施設：備品

[令和5～6年に市及び管理者で準備予定の備品一覧]

	no.	備品等名称	規格等	数量	単位	摘要	備考
屋内	1	長机	L1800*W450	11	台	個別キャスター(or折畳式)	
	2	同収納台車	2000*700	1	台	※キャスター付きは不要	
	3	椅子	パイプ椅子	33	脚	積重ね(or折畳式)	
	4	同収納台車	1500*600	1	台		
	5	パーティション	H1800×W900	6	台		
	6	ホワイトボード	H1800×W1800	1	台		
	7	多目的ボード(壁面)	H900×W1800	6	枚		
	8	事務カウンター(展示棚)	H900×D450×L900	5	台	L900の組み合わせ	
	9	事務机		2	台		
	10	同上椅子		2	脚		
	11	棚(事務スペース背面)	H900×D300×L900	4	台	L900の組み合わせ	
	12	棚(事務スペース側面)	H1800×D450×L900	1	台		
	13	プロジェクター		1	台		
	14	スクリーン		1	台		
	15	脚立		1	台	天井収納スペース用	
	16	縁台	1200×900×2台組	2	台	エントランス付近の休憩用	
	17	カーテン	立面図参照	1	式	プロジェクター利用時用	
	18	ロッカー(管理者用)	W600×D500×H1800程度	1	台	2人用	
	19	パソコン		2	台		管理者にて対応
	20	プリンター複合機		1	台	プリンター、電話、ファックス	管理者にて対応
	21	タイムレコーダー		1	台		管理者にて対応
	22	シュレッダー		1	台		
	23	掃除機		1	台		
屋外	24	倉庫	W1800×D900×H1800程度	2	基		
	25	屋外展示用掲示板	W800×H2000程度	1	基		

[参考：拠点施設平面図]

